


DEUXIEME CHAPITRE - LA CONDUITE DU PROCESSUS DES PROJETS INFORMATIQUES

L'administration d'un projet informatique en mutation requiert un ensemble d'opérations impliquant des exécutions fortuites. C'est pourquoi l'IPMA précise que *« le conduite de projet consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet, ainsi que la motivation de tous ceux qui sont impliqués dans le projet, de façon à atteindre les objectifs de façon sûre et dans les critères définis de coûts, délais et performance »*.

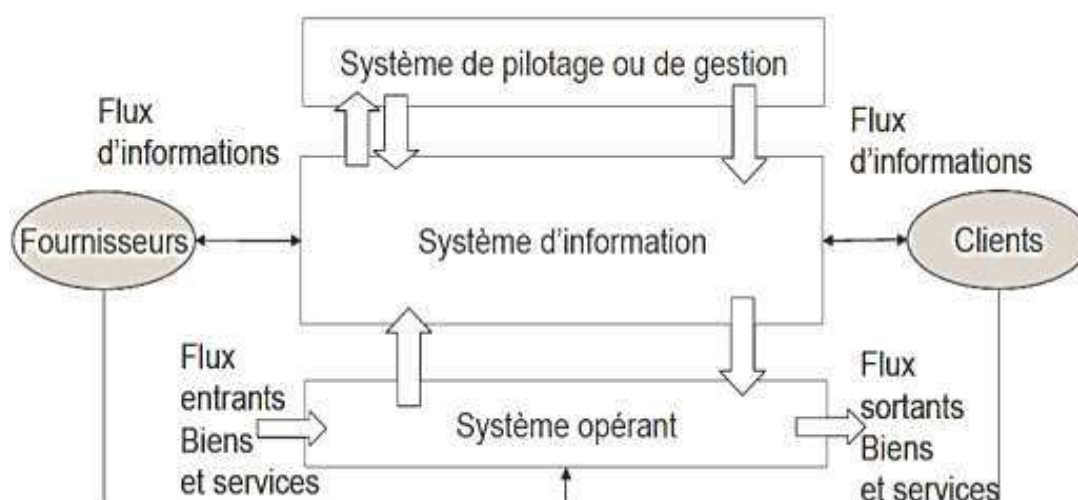

II.1. LES ACTIVITÉS DE GESTION DE PROJET


Pour le PMBOK, la gestion de projet est *« l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de méthodes aux activités d'un projet afin de répondre à ses besoins »*. Il convient toutefois de distinguer deux catégories d'activités dans un projet :

- **les activités de production** : sont celles qui sont nécessaires pour réaliser le produit ou service visé par l'objectif du projet ;
- **les activités de gestion de projet** : sont celles qui consistent à planifier le travail, l'organiser et suivre l'avancement des activités de production.

Le champ de la conduite de projets informatiques est calé sur les trois aspects représentés par le triangle Projet. Ainsi :

- *Le délai* donne lieu à une *gestion du temps* dont le rôle est de définir le parcours et de le jalonner, d'établir des calendriers et de maîtriser la consommation de l'enveloppe temps.
- *Les moyens affectés* constituent le *budget du projet*, qui est transformé en travail, locaux, matériel, temps machine, déplacement... Cette transformation nécessite une *gestion des ressources* portant sur les ressources humaines et les moyens matériels.
- *L'objectif du projet* doit à son terme être concrétisé par une ou plusieurs fournitures. Cela implique une *gestion de la production*, qui a pour but de suivre et diriger l'avancement vers l'objectif tout au long du projet. On parle parfois de « *faire converger le projet* » : cela signifie qu'il faut sans cesse s'assurer que l'on se rapproche du but et que l'on ne part pas dans des directions remettant en cause un avancement consolidé.

On peut décomposer l'activité de la conduite des projets informatiques en trois activités principales autour de la production proprement dite :

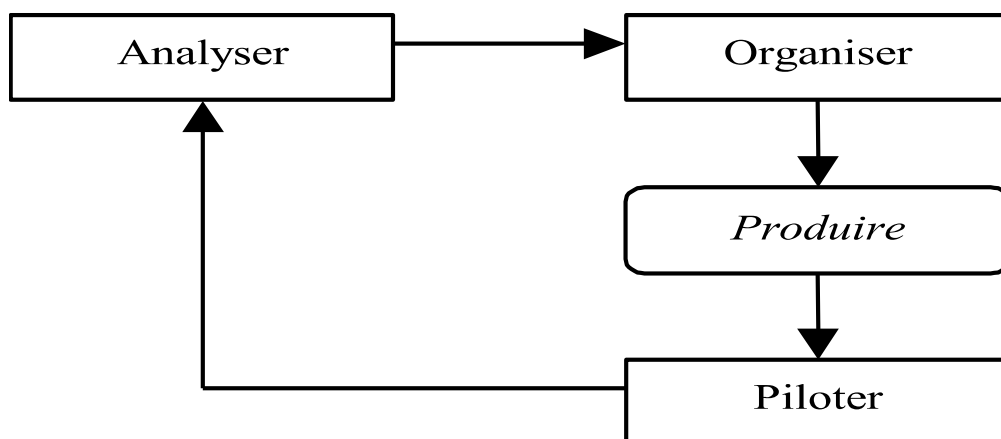

Les activités de gestion de projet

- **Analyser** : consiste à déterminer le chemin que l'on va emprunter pour avancer vers l'objectif. Pour cela, on étudie les caractéristiques du projet, son contexte, les risques qui le menacent et l'état de son avancement. Cela conduit à un découpage du projet en actions à entreprendre et à une estimation de l'effort nécessaire. La maille de cette analyse varie selon le moment du projet auquel on se place.

- **Organiser** : signifie repérer les contraintes d'enchaînement entre les tâches afin de les ordonnancer. Cela permet d'établir un calendrier. L'organisation recouvre aussi la constitution d'une équipe, c'est-à-dire des personnes qui sont affectées et imputées au projet, en déterminant les bons profils. Les relations avec tous les partenaires nécessaires sont également prises en compte. Dès que la charge est importante, on répartit le travail entre plusieurs personnes, voire plusieurs équipes, ce qui conduit à mettre en place des moyens de partage d'informations pour éviter les incohérences.
- **Produire** : consiste à assurer les actions diverses (*cultures, fabrications, etc.*) qui concourent à fournir sur le marché commercial certains biens ou services.
- **Piloter** : comprend le suivi de l'avancement du projet, en quantité et en qualité, ainsi que l'analyse et le traitement des écarts avec ce qui était prévu, les orientations et les décisions à prendre ou à faire prendre. Le pilotage inclut également le management de l'équipe et la gestion des conflits.

Pour la norme ISO10006: 2003, les activités de gestion de projet sont organisées en processus, et réparties en quatre familles :

- **La première famille** ne comprend qu'un seul processus, appelé processus stratégique, qui regroupe les activités relevant de la responsabilité de la direction de l'entreprise, telle que la nomination des chefs de projet.
- **La deuxième famille** comprend des processus qui touchent à la gestion des ressources, en particulier le personnel.
- **La troisième famille** structure les activités de gestion de projet orientées vers la réalisation du produit, c'est-à-dire la production du bien ou service visé par l'objectif. Elle comprend la coordination des activités, la maîtrise des tâches de production, la maîtrise des délais et des coûts, la gestion de la communication, la maîtrise des risques et celle des achats pour le projet.
- **La quatrième famille** de processus réunit les activités de gestion de projet, qui visent l'amélioration, c'est-à-dire le management des connaissances issues des projets achevés.

II.2. PRINCIPAUX ACTEURS DANS UN PROJET INFORMATIQUE

Un acteur est quelqu'un qui joue un *rôle* dans le déroulement du projet. La notion de rôle est importante dans un univers projet. C'est une fonction temporaire, déconnectée de la place qu'occupe la personne dans l'organigramme de l'entreprise ; on attache au rôle des activités à effectuer et une responsabilité. Quand on organise un projet, on commence par déterminer les rôles nécessaires. On distingue trois types d'acteurs participant à un projet de développement de système d'information :

- le maître d'œuvre et
- le maître d'ouvrage ;
- l'équipe de projet ;
- les utilisateurs.



Les intervenants du projet informatique doivent être identifiés avec leurs rôles et les fonctions qu'ils doivent remplir dans quel ordre et dans quelles conditions. Cette notion de responsable à chaque niveau d'intervention est essentielle à la bonne marche du projet. *La première démarche* consiste à définir les conditions d'intervention des différents partenaires et *la seconde* à préciser les liens qui peuvent exister entre eux.

II.2.1. LE MAITRE D'OUVRAGE

Selon l'AFNOR, le maître d'ouvrage est « *la personne physique ou, le plus souvent, personne morale qui sera le propriétaire de l'ouvrage. Il fixe les objectifs, l'enveloppe budgétaire et les délais souhaités pour le projet* ». À ce titre, il « *assure le paiement des dépenses liées à la réalisation* ».

Les rôles de *maître d'œuvre* et *maître d'ouvrage*⁸ sont issus des grands projets industriels. Ils sont liés par une relation contractuelle. *Le maître d'ouvrage* représente « *le client* ». Partant d'une demande des futurs utilisateurs du système, il établit un cahier des charges qui peut servir de base à un appel d'offres. Après discussions sur une ou plusieurs propositions reçues, il passe contrat avec un fournisseur qui jouera le rôle de maître d'œuvre. Celui-ci est responsable de la conduite du projet. *Le maître d'ouvrage assure un suivi de l'avancement du projet, selon des modalités contractuellement définies*. À chaque fourniture contractuelle par le maître d'œuvre, il procède à la recette et prononce l'acceptation ou le refus. Il pilote la mise en œuvre du projet. Strictement parlant, *l'ouvrage est le résultat concret d'un projet : construction, matériel, progiciel*. Bref, c'est le « *bailleur de fonds* ».

II.2.2. LE MAITRE D'OEUVRE

Le maître d'œuvre est « *la personne physique ou morale qui réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage et qui assure la responsabilité globale de la qualité technique, du délai et du coût* ». L'œuvre est définie comme « *le processus de réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire la mise en place des moyens nécessaires à cette réalisation et à leur conduite* ». Par conséquent, elle « *est constituée de l'ensemble des tâches, regroupées ou non en lots de travaux* ».

II.2.3. L'EQUIPE DU PROJET

L'*équipe de projet* rassemble différents acteurs, qui sont affectés au projet⁹. D'après, l'AFNOR, c'est « *l'ensemble des personnes placées sous l'autorité directe (et quelquefois indirecte) du chef de projet* ». Mais, on peut parfois considérer que l'équipe de projet s'étend à *toutes les personnes participant à la réalisation du projet*. On distingue ainsi trois différents types d'acteurs dans l'équipe de projet :

- Le *chef de projet*, est responsable devant le maître d'œuvre de l'avancement du projet.
- Le *concepteur*, qui peut être tenu par un informaticien, et qui joue le rôle d'un organisateur ou un gestionnaire selon le stade d'avancement : sa responsabilité est de concevoir le futur système aux étapes étude préalable et étude détaillée.

Le *développeur*, qui est tenu par un informaticien : sa responsabilité est d'écrire les programmes ou de réaliser un prototype. Pour certains développements réalisés en langage de 4e génération, le rôle peut être tenu par un gestionnaire.

⁸ La transposition de ces deux rôles quand il s'agit de système d'information renvoie davantage à la répartition des responsabilités qu'à la notion de propriété. En effet, même si l'on parle parfois du « *propriétaire d'une application informatique* », il est difficile d'étendre ce droit de propriété aux processus et aux acteurs.

⁹ Les autres différents acteurs, qui sont affectés au projet peuvent aussi être *les consultants, analystes, développeurs ...*).

La performance d'une équipe dépend de l'équilibre de ces positionnements, appelés « rôles », parmi les membres. Au-delà de la répartition des activités, chacun endosse en général un « rôle », et des rôles complémentaires favoriseront la synergie, alors que des « rôles » non endossés manqueront dans la dynamique du groupe. C'est ainsi **Meredith Belbin**¹⁰ a identifié neuf types de « rôles » regroupés en trois catégories, selon l'orientation majeure : *vers les personnes*, *vers l'action* et *vers la production intellectuelle* :

- **Les rôles orientés vers les personnes sont les suivants :**
 - *Le coordinateur* a tendance à clarifier les buts et favoriser la prise de décision dans le groupe ;
 - *Le coéquipier* est attentif aux autres et les encourage ;
 - *Le pourvoyeur de ressources*, dispose d'un carnet d'adresses qu'il est prêt à ouvrir pour les membres du groupe.
- **Les rôles orientés vers l'action sont les suivants :**
 - *L'organisateur* a tendance à traduire les idées en tâches concrètes ;
 - *L'entraîneur* aide l'équipe à conserver le cap vers les objectifs et maintient la pression ;
 - *Le contrôleur* vérifie les détails, il a le souci du respect du calendrier et des engagements.
- **Les rôles orientés vers l'intellect sont les suivants :**
 - *L'innovateur* propose de nouvelles idées, mais il peut être irréaliste et peu communicateur.
 - *L'évaluateur* est au contraire réaliste et il aime analyser les problèmes complexes.
 - *Le spécialiste* possède des connaissances précises, utiles à l'équipe.

II.2.4. LES UTILISATEURS

Les utilisateurs ont pour rôle la mise en correspondance avec les fonctions permanentes du développement du produit réalisé. Ces derniers peuvent représenter différents niveaux : *décideurs*, *gestionnaires* ou *utilisateurs finals*. Quand on évoque l'intervention d'utilisateurs dans un projet, on emploie souvent le terme générique de « *participation* ». En réalité, la nature et les modalités de participation peuvent présenter une grande variété et servir différents buts. Dans une perspective de pilotage de projet, on considère que la participation peut avoir un effet sur la détermination des besoins, sur le processus de décision ou sur une évolution organisationnelle.

¹⁰ Professeur à l'université de Cambridge.

On peut alors distinguer 3 catégories des utilisateurs :

- L'*utilisateur final* est celui qui va utiliser les transactions et les éditions du futur système dans son travail au quotidien. C'est, par exemple, l'employé de l'agence bancaire qui se sert de son terminal pour effectuer les opérations avec la clientèle. La responsabilité attachée à ce rôle est d'exprimer des besoins et des contraintes liées au travail courant.
- L'*utilisateur gestionnaire* est un opérationnel qui a des responsabilités d'encadrement. Il utilisera le futur système pour obtenir des informations permettant de prendre des décisions de gestion. Par exemple, un responsable produit attendra des informations permettant de suivre une vente promotionnelle. La responsabilité attachée à ce rôle est d'exprimer des besoins en informations favorisant la gestion à moyen terme de l'activité.
- L'*utilisateur décideur* a le pouvoir de modifier les règles du système de gestion, pour utiliser au mieux les possibilités technologiques. Sa responsabilité est de prendre des décisions sur l'évolution des règles de gestion.


Ainsi la participation peut avoir pour objectif de transférer à l'équipe de projet une connaissance sur un domaine, un système de gestion, une organisation existante. La participation peut faciliter le processus de décision, en augmentant la visibilité des décideurs sur les enjeux et conséquences des décisions. Si les utilisateurs sont multiples, la prise de décisions passe par la construction d'un consensus. On peut citer à cet égard la technique JRP¹¹. Enfin, la participation peut rechercher des décisions d'orientation et de poursuite du projet. Les utilisateurs visés sont des décideurs, et la poursuite du projet pourra dépendre de leur appréciation et de leur engagement. Cette participation se fait généralement à travers un comité de pilotage, mais elle peut être plus informelle.

Prendre une décision, c'est souvent prendre un risque. Celui-ci est d'autant plus grand que les conséquences du choix se font sentir à moyen ou long terme. C'est pourquoi on observe parfois une réticence à s'engager. La participation permet de réduire cette crainte, en donnant aux décideurs une meilleure connaissance du projet et en offrant des possibilités d'échange et de discussion avec d'autres acteurs. La participation peut enfin faciliter l'utilisation du futur système par l'utilisateur final.

¹¹JRP (Joint Requirements Planning). Elle a pour objectif de donner un rôle actif à l'utilisateur lors de l'étape d'expression des besoins, afin de réduire la durée de cette étape et d'en augmenter la qualité. Les utilisateurs, qui sont également décideurs, jouent alors un rôle central : ils effectuent la collecte des informations nécessaires à l'expression des besoins ; ensuite, réunis en session avec les informaticiens, ils présentent leurs résultats qui sont confrontés, amendés, acceptés, pendant une période de temps courte mais dense.

II.3. NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ DANS LE PROJET INFORMATIQUE

En matière de gestion de projets informatiques, le niveau de responsabilités, c'est un ensemble des étapes successives de l'analyse, hiérarchiquement subordonnées les unes aux autres à partir d'une unité supérieure, c'est-à-dire c'est un échelon (degré) d'un ensemble organisé des implications dans une hiérarchie quelconque. Comme dans la plupart des organisations humaines, la distribution des responsabilités et des tâches se fait sur le mode pyramidal du schéma ci-contre. Décrivons sommairement les quatre niveaux, en partant de la base de la pyramide.

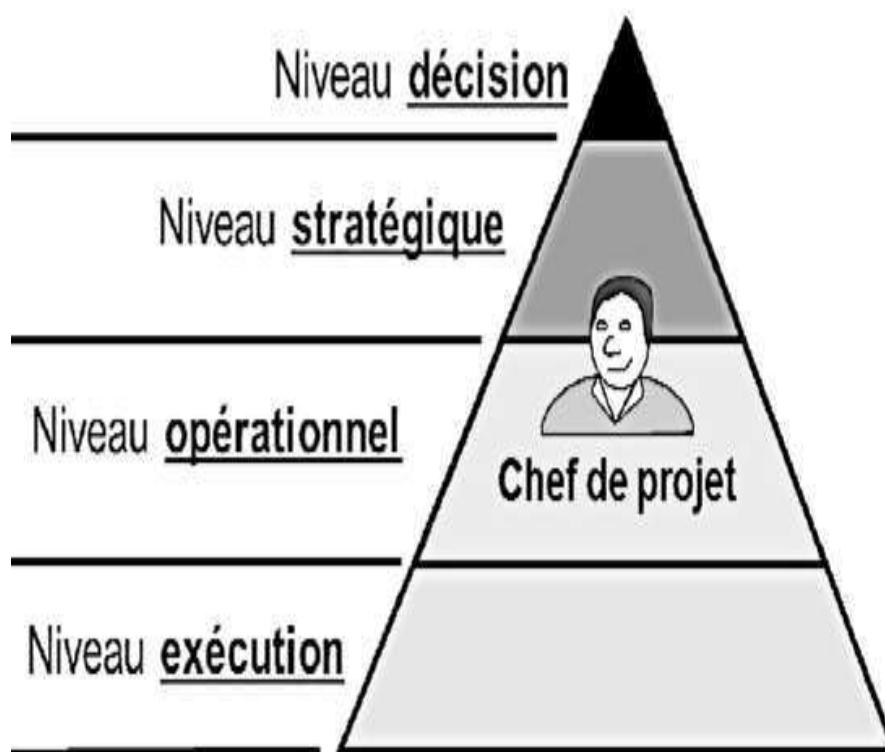

- **Le niveau exécution** : est celui des entreprises en charge des travaux et des contributeurs internes, sollicités pour leur expertise métier. Le niveau exécution réalise les différents livrables du projet. Il applique les directives établies par le niveau opérationnel et lui rend compte des problèmes éventuels et de l'avancement. Le niveau exécution n'a pas à connaître du projet plus que les informations strictement nécessaire à la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées.
- **Le niveau opérationnel** : est celui du chef de projet et de son équipe. Il décline les exigences du cahier des charges en solutions techniques et en tâches à accomplir. Il pilote le projet au quotidien, détecte et corrige les écarts et rend compte au niveau stratégique.

- **Le niveau stratégique** : détermine l'objectif, nomme le chef de projet, définit le cadre général du projet et l'organisation, puis s'assure que la trajectoire du projet est conforme aux prévisions. Bien entendu il intervient en cas d'écart grave, sur demande du chef de projet ou de sa propre initiative.
- **Le niveau décision** : prend les grandes orientations, en principe sur proposition du niveau stratégique. Les solutions de gestion de projet diffèrent entre elles, en premier lieu par le service qu'elles rendent (*ou pas*) aux acteurs des différents niveaux. A minima, elles permettent au chef de projet de piloter les travaux. Les solutions les plus abouties fournissent aux acteurs de chaque niveau les informations qui leur sont utiles : un exécutant aura la vision des tâches qu'il doit accomplir, le chef de projet aura accès à la totalité des données du projet. Quant aux acteurs du niveau stratégique, ils disposeront d'un tableau de bord synthétique les renseignant principalement sur la santé du projet. Bien entendu toute information saisie à un niveau est instantanément répercutée par le système aux acteurs concernés, c'est bien le moins que l'on attende d'un système informatique.

L'AFITEP appelle « *management de projet* », l'ensemble des activités de gestion de projet et introduit une distinction entre deux rôles. Le chef de projet est responsable de la « *direction de projet* » et s'appuie sur des assistants chefs de projet qui accomplissent des tâches rassemblées sous le terme « *gestion de projet* ». Ces deux rôles correspondent à deux niveaux de certification. La direction de projet, qui est toujours exercée par le chef de projet, a pour mission essentielle de définir la stratégie de conduite du projet, de coordonner l'ensemble des actions, de modifier le plan de marche si nécessaire, et d'optimiser l'utilisation des ressources.


Pour accomplir la mission de direction de projet, le chef de projet a besoin d'analyser les risques, d'estimer la charge, d'organiser le travail, de le planifier, de le suivre. Pour cela, il doit effectuer, ou faire effectuer, un ensemble de tâches relevant de la gestion de projet, notamment la préparation des différents plans et l'élaboration de tableaux de bord de suivi. La distinction entre gestion et direction de projet n'est pas, à ce jour, reprise par les autres acteurs de la normalisation.

II.4. ROLES DE CHEF DE PROJET

Par définition, Le chef de projet est défini par l'AFNOR comme : « *la personne physique chargée par le maître d'œuvre, dans le cadre d'une mission définie, d'assurer la maîtrise du projet, c'est-à-dire de veiller à sa bonne réalisation dans les objectifs de technique, de coût et de délai* ». Cette définition est insuffisante pour les projets système d'information. Heureusement, la définition est élargie : « *Souvent le maître d'ouvrage identifie, en son sein, un interlocuteur au chef de projet du maître d'œuvre. Cet interlocuteur est aussi appelé chef de projet* »¹².

Le chef de projet doit faire en sorte que le projet réussisse. Pour cela, sa responsabilité est multiple : il a la charge d'une bonne gestion du groupe et des individus ; il pilote la production des livrables pour un achèvement en temps et en heure ; il participe à la gestion du changement, en particulier auprès des acteurs clés du projet ; il lui revient enfin de veiller à ce que les processus de décision ne soient pas bloqués. Un chef de projet doit au préalable développé les éléments suivants :

- les styles de management (conduite) d'équipe et leur adéquation ou inadéquation à différentes situations pour atteindre les objectifs du projet;
- la motivation des membres de l'équipe ;
- la gestion des conflits à l'extérieur du groupe de projet.

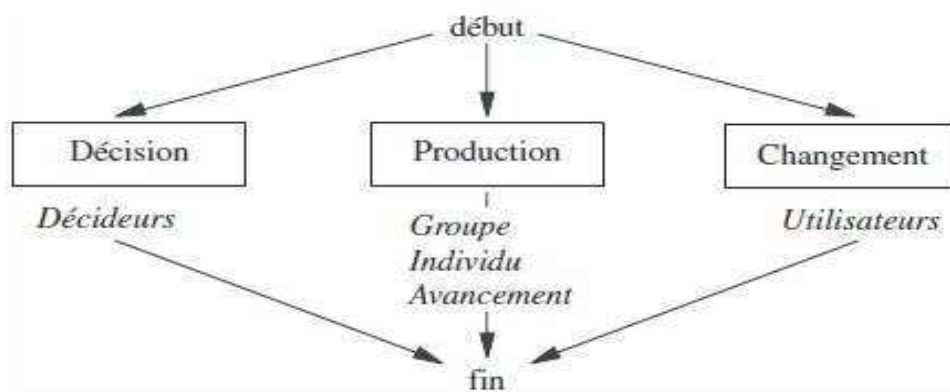


- **Il est responsable du groupe** - D'un ensemble d'individus, il doit constituer une équipe, l'animer et en maintenir la cohésion. L'équipe prend corps lorsque l'objectif (le projet) devient collectif. Pour obtenir cette adhésion et cette synergie, il faut que chacun soit responsable en propre d'une partie du travail ; il faut favoriser les échanges latéraux grâce notamment à des points réguliers de coordination. L'esprit de groupe se construit par des échanges directs d'individu à individu sur un but commun. C'est pourquoi il est souhaitable que la taille de l'équipe reste limitée. Au-delà de quinze à vingt personnes, le sentiment d'appartenance se dilue.

¹² AFITEP, 2000

- **Le chef de projet est responsable des individus membres de l'équipe**, qu'il doit valoriser et soutenir. Ce domaine est l'un de ceux où, par chance, le travail est souvent un moyen de se réaliser. Or, la satisfaction qu'un acteur retire de son activité sur le projet est le plus puissant des moteurs. Chercher à ce que chacun se sente gratifié par le travail accompli est une excellente approche managériale.
- **Le chef de projet doit prendre en compte les souhaits des individus et l'enrichissement apporté**, lorsqu'il attribue les tâches. L'estimation de la charge affectée doit être négociée avec celui qui va accomplir la tâche correspondante. S'il y avait désaccord dès le départ, le risque serait grand de dépasser le délai. L'avancement doit être suivi de près, pour ne pas laisser l'un ou l'autre piétiner. En cas de difficulté, le dialogue est indispensable. Un retard sur une tâche peut être dû à une cause exogène (*panne de la machine de développement*) ou organisationnelle (*demande de fonctionnalité supplémentaire*), qui est du ressort du chef de projet.
- **Le chef de projet est également responsable de l'avancement des travaux et doit convaincre l'équipe de la nécessité d'un suivi adéquat**. Le système d'information projet est indispensable à la réussite : il faut que les chiffres de base soient le plus juste possible. Pour cela, le chef de projet doit utiliser avec perspicacité les chiffres issus du bilan individuel. Les informations du compte rendu d'avancement doivent être traitées immédiatement.
- **Le chef de projet est un acteur du changement parmi les utilisateurs** - Il doit pour cela organiser une participation adaptée afin de créer un noyau qui portera le changement. Si aucune dynamique n'a été déclenchée parmi les utilisateurs, la mise en œuvre risque d'être difficile et le succès du projet compromis. Il appartient au chef de projet de repérer et d'associer au projet certains utilisateurs convaincus de son utilité et qui s'en feront les précurseurs.
- Le chef de projet est, à certains égards, **le pilote des décisions** touchant au contenu du projet. Toute décision à prendre, si elle n'est pas prise immédiatement, doit lui être signalée. Toutes celles qui sont en suspens doivent figurer sur son tableau de bord, pour qu'il en suive le traitement. Il doit parfois aider à choisir en apportant un éclairage aux décideurs ou en proposant des solutions flexibles si un choix définitif ne peut être fait.

II.5. L'ADMINISTRATION DU CYCLE DE PROJETS INFORMATIQUES

Du moment où le projet a un début et une fin, cette notion conduit à la notion de cycle de projet. Ce cycle peut se résumer dans le schéma suivant :

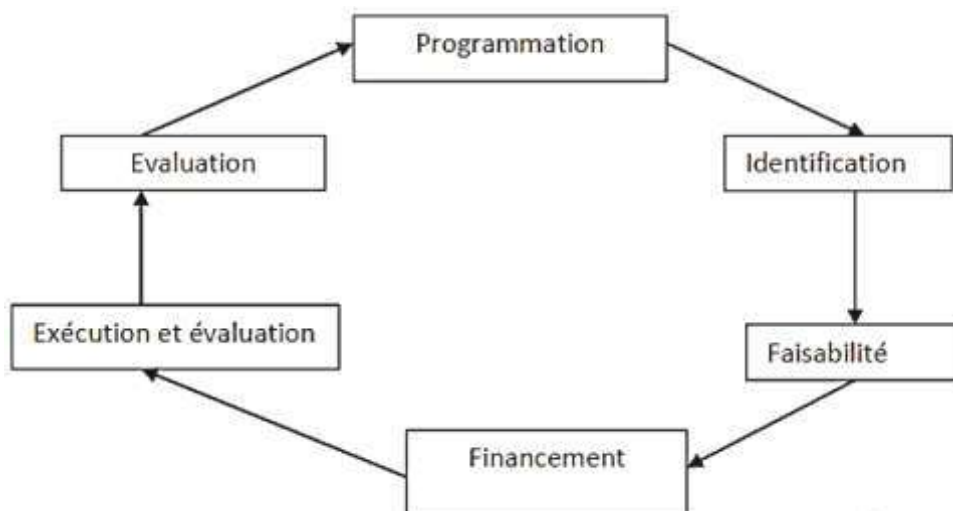

1. **La programmation :** Le processus de programmation est l'issus d'un document global stratégique pour un pays donné. Ce document détermine les différentes perceptions, profils et diagnostic sur l'ensemble d'un pays et il doit être en accord avec la législation de ce dernier pour l'exécution d'un projet informatique.
2. **L'Identification :** C'est une phase clé dans laquelle les analyses suivantes sont faites pour garantir la pertinence et la faisabilité d'une idée de projet :
 - Analyse du contexte politique et de programmation ;
 - Analyse des parties prenantes, y compris l'analyse de la capacité institutionnelle ;
 - Analyse des problèmes, y compris la prise en compte des questions transversales (*genre, gouvernance, environnement,...*) ;
 - Appréciation d'autres initiatives similaires en cours et prévus, et des enseignements tirés du passé ;
 - Analyse préliminaires des objectifs et des stratégies;
 - Une première appréciation des implications au niveau des moyens et des coûts;
 - Une première analyse des dispositifs de mise en œuvre, coordination et financement;
 - Analyse préliminaire de la viabilité économique, financière, environnementale, technique et sociale.

3. La Faisabilité : cette phase, il est question de voir si le projet répond aux besoins prioritaires (*pertinence*), le projet a été bien conçu et apporte des avantages tangibles et durables aux groupes cibles, la formulation du projet est bien gérée (*bonne gestion*) ... Cette étape a deux objectifs principaux :

- Démontrer, à l'institution qui va mener le projet, que celui-ci est faisable, viable et rentable;
- Servir de document de référence à toute requête de financement adressée à des bailleurs de fonds externes.

En outre dans

4. Le Financement : Le financement a comme objectifs de permettre l'appréciation du projet par l'organisme de financement et la négociation avec l'organisme de financement avant la passation d'accord de financement, quel qu'en soit le statut: subvention, prêts, apport en nature. Voici les étapes clés dans la phase de financement :

- Introduction de la demande de financement par le l'organisme promoteur du projet s'appuyant sur l'étude de faisabilité ;
- Appréciation de la demande par le bailleur de fonds (*comportant souvent une mission d'appréciation sur le terrain*) ;
- Négociation technique portant sur le contenu technique du projet ;
- Négociation portant sur les aspects financiers du projet: montant de la participation, termes et conditions (*taux d'intérêts, durée de remboursement*) et sur les conditions de financement (*procédure d'exécution, ...*) ;
- Signature de la convention de financement.

5. La mise en œuvre : La mise en œuvre a comme objectif de permettre au projet de produire les résultats, atteindre les buts et contribuer efficacement aux objectifs globaux du projet, gérer les ressources disponibles de façon efficiente, suivre le déroulement et en faire les comptes-rendus. Les principales phases de mise en œuvre du projet sont :

- *Le démarrage :* cette phase regroupe les éléments ci-après : les différentes terminaisons des conventions, la mobilisation des ressources, la définition des conditions et relations du travail, l'aménagement du démarrage, les auditions et révisions du schéma du projet et l'établissement des systèmes d'évaluation et de contrôle (*M&E*).

- *La mise en œuvre proprement dite* : celle-ci regroupe fréquemment les éléments suivants : la mise en place des ressources, la mise en œuvre des activités et obtention des résultats, le suivi et le contrôle de l'état de l'avancement du projet, la révision des plans opérationnels, et les rapports sur l'état de l'avancement du projet.
- *La phase finale* : celle-ci regroupe autant graduellement les éléments suivants : les différents transferts de toutes les responsabilités aux collaborateurs régionaux, la vérification de la mise en place des plans d'entretien, la vérification du transfert réel des compétences indispensables, la vérification de la couverture des dépenses récurrentes.

6. L'évaluation : L'évaluation a pour but d'effectuer une appréciation, aussi systématique et objective que possible, d'un projet, d'un programme ou d'une politique, en cours ou achevé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Elle se fixe à trois types de résultats :

- *La réalisation physique du projet* : voir si le projet est en train d'être exécuté physiquement ;
- *L'évaluation des effets* : vise à estimer dans quelle mesure les actions du projet ont eu les effets visés ;
- *L'évaluation des impacts* : mesure les améliorations des conditions de vie que les effets du projet ont pu entraîner.

Une bonne évaluation dans un projet informatique requiert Les principes ci-après :

- *L'Impartialité et indépendance*, du processus d'évaluation par rapport aux fonctions de programmation et de mise en œuvre ;
- *La Crédibilité*, de l'évaluation, grâce à l'intervention d'experts indépendants et compétents et à la transparence du processus ;
- *La Participation*, des parties prenantes au processus d'évaluation, afin de garantir que les différents aspects et points de vue soient pris en compte ;
- *L'Utilité*, des observations et recommandations de l'évaluation, grâce à la fourniture en temps utile aux décideurs d'une information pertinente, claire et concise.
