

Nom et Prénom :

Mardi 30 Janvier 2024

Évaluation Module :
Management et planification de projet

Partie 1 (QCM) :

1. Qu'est-ce que le triangle de fer dans le contexte du management de projet ?

- ☐ Un outil de mesure de la productivité
- ☐ Un modèle financier
- ☒ Un concept représentant la relation entre la portée, le délai et les coûts d'un projet
- ☐ Un diagramme de Gantt

2. Quelle est la principale responsabilité d'un chef de projet ?

- ☐ Concevoir le produit final
- ☐ Superviser le travail quotidien des membres de l'équipe
- ☒ Gérer les ressources, le calendrier et le budget du projet
- ☐ Prendre toutes les décisions importantes sans consulter l'équipe

3. Qu'est-ce que le chemin critique dans la planification d'un projet ?

- ☐ La séquence d'activités qui nécessite le plus de ressources
- ☒ La séquence d'activités qui détermine la durée totale du projet
- ☐ La partie du projet la plus difficile à réaliser
- ☐ La séquence d'activités qui peut être ignorée sans impact sur le projet

4. Qu'est-ce que la gestion des risques dans le contexte du management de projet ?

- ☐ Éviter tous les risques possibles
- ☐ Ignorer les risques jusqu'à ce qu'ils surviennent
- ☒ Identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels
- ☐ Reporter la gestion des risques à la fin du projet

5. Quelle est l'importance de la communication dans la gestion de projet ?

- ☐ Faciliter la diffusion d'informations inutiles
- ☐ Éviter toute communication pour éviter les conflits
- ☒ Assurer une compréhension commune des objectifs et des progrès du projet
- ☐ Limiter la communication aux membres de l'équipe uniquement

6. Qu'est-ce que la méthode PERT dans le contexte du management de projet ?

- ☐ Un outil d'estimation des coûts
- ☒ une technique de planification basée sur des estimations pessimistes, optimistes et réalistes
- ☐ Un logiciel de gestion de projet
- ☐ Une approche agile

7. Quel est le rôle d'un comité de pilotage dans un projet ?

- ☐ Effectuer des tâches opérationnelles
- ☒ rendre des décisions stratégiques et donner des orientations au projet
- ☐ Exécuter les activités du projet
- ☐ Assurer la communication quotidienne au sein de l'équipe

8. Qu'est-ce qu'une revue de projet (project review) ?

- ☐ Une réunion informelle pour discuter des problèmes personnels des membres de l'équipe
- ☒ Un examen formel de l'état d'avancement, des résultats et des performances du projet
- ☐ Une évaluation des compétences individuelles des membres de l'équipe
- ☐ Un audit financier du projet

9. Qu'est-ce qu'un livrable (deliverable) dans le contexte du management de projet ?

- ☐ Une réunion de l'équipe projet
- ☒ Un produit, un résultat ou une capacité unique fourni par un projet
- ☐ Un document de planification
- ☐ Une estimation des coûts

10. Qu'est-ce que le tableau de bord de projet (project dashboard) ?

- ☐ Un panneau d'affichage physique dans le bureau du chef de projet.
- ☒ Un outil de visualisation qui fournit des informations synthétiques sur l'état d'avancement du projet.
- ☐ Un document détaillé sur les performances individuelles des membres de l'équipe.
- ☐ Un plan de gestion des risques.

11. Quelle est l'importance de l'analyse SWOT dans la gestion de projet ?

- ☐ Elle identifie les parties prenantes du projet.
- ☒ Elle évalue les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées au projet.
- ☐ Elle définit la portée du projet.
- ☐ Elle établit un calendrier détaillé.

12. Que représente le terme "WBS" dans le contexte du management de projet ?

- ☒ Work Breakdown Structure
- ☐ Weekly Budget Summary
- ☐ Workforce Building Strategy
- ☐ Workflow Balance System

13. Qu'est-ce que la méthode Scrum dans le contexte du développement de logiciels ?

- ☒ Une méthode de gestion de projet basée sur des itérations courtes et des équipes auto-organisées
- ☐ Une approche traditionnelle de gestion de projet en cascade
- ☐ Un outil de gestion des risques
- ☐ Une méthode exclusive pour les grandes entreprises

14. Qu'est-ce que le diagramme de Gantt ?

- ☐ Un outil d'évaluation des compétences de l'équipe projet
- ☒ Un graphique qui représente la séquence des tâches du projet sur une ligne de temps
- ☐ Une méthode de gestion des conflits
- ☐ Un modèle financier

15. Qu'est-ce que le modèle RACI dans la gestion de projet ?

- ☐ Un modèle financier pour évaluer les coûts du projet
- ☐ Un modèle d'évaluation des risques
- ☐ Un outil de planification du projet
- ☒ Un modèle qui définit les responsabilités pour chaque tâche ou livrable

16. Quel est le principal objectif de la phase de clôture d'un projet ?

- ☐ Évaluer la performance de l'équipe
- ☐ Distribuer les récompenses aux membres de l'équipe
- ☒ Formaliser la fin du projet et garantir la satisfaction du client
- ☐ Commencer immédiatement le projet suivant

Partie 2 : Question de cours et applications

1. Qu'est-ce qu'un livrable d'un projet ?

Réponses : Un livrable d'un projet est un résultat tangible ou intangible produit à la fin d'une phase ou d'une activité du projet, souvent livré à un client ou à une partie prenante.

Quelles sont les caractéristiques d'un projet ?

Réponses : Les caractéristiques d'un projet incluent un début et une fin définis, des objectifs spécifiques, des ressources limitées, une planification, une organisation temporaire et des risques à gérer.

Décrire le cycle de vie et les principales étapes d'un projet selon le PMBOOK ainsi les livrables dans chaque étape ?

Réponses : Le cycle de vie d'un projet selon le PMBOK comprend cinq étapes : l'initiation, la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle, et la clôture. Les livrables varient selon chaque phase, mais généralement, la phase de planification produit des plans détaillés, l'exécution produit des produits ou services livrables, et la clôture produit des rapports et des évaluations.

2. Quelles sont les éléments essentiels pour élaborer de la charte de projet ?

Les éléments essentiels pour élaborer la charte de projet incluent le nom et la description du projet, les objectifs, les parties prenantes, les contraintes, les risques initiaux, le budget et les ressources préliminaires.

MANAGEMENT INDUSTRIEL ET INGÉNIERIE

التدبير الصناعي والهندسة


3. Tracer le diagramme de PERT et de GANT pour le projet suivant :

(Faire l'application dans une feuille et la mettre sous forme une photo dans la partie réponse)


Description des tâches	Tâches antérieures	Durée (jour)
A-découpage des éléments chassis	/	2
B-assemblage moteur	/	1
C-montage chassis, moteur, cabine	E,B,H	1
D-pose pare-brise, guidon, manette...	C	2
E-perçage, soudure chassis	A	1
F-vérification du fonctionnement	E,B,H	2
G- essai du scooter	D,F	1
H-préparation cabine et accessoires	/	3

Diagramme PERT

Réponses :

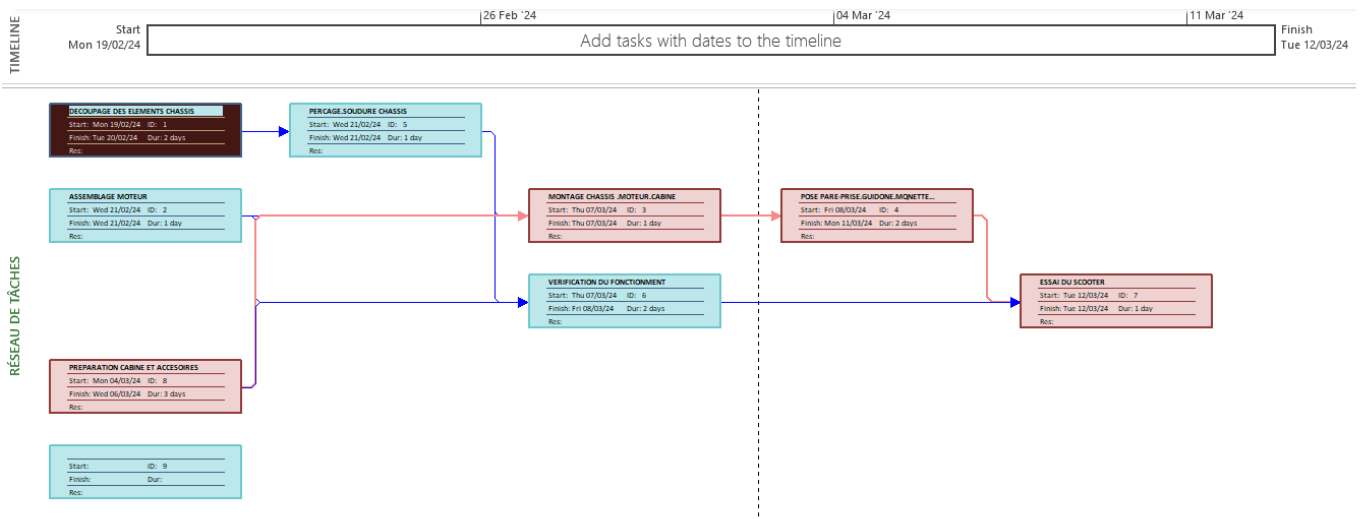

Réponses :

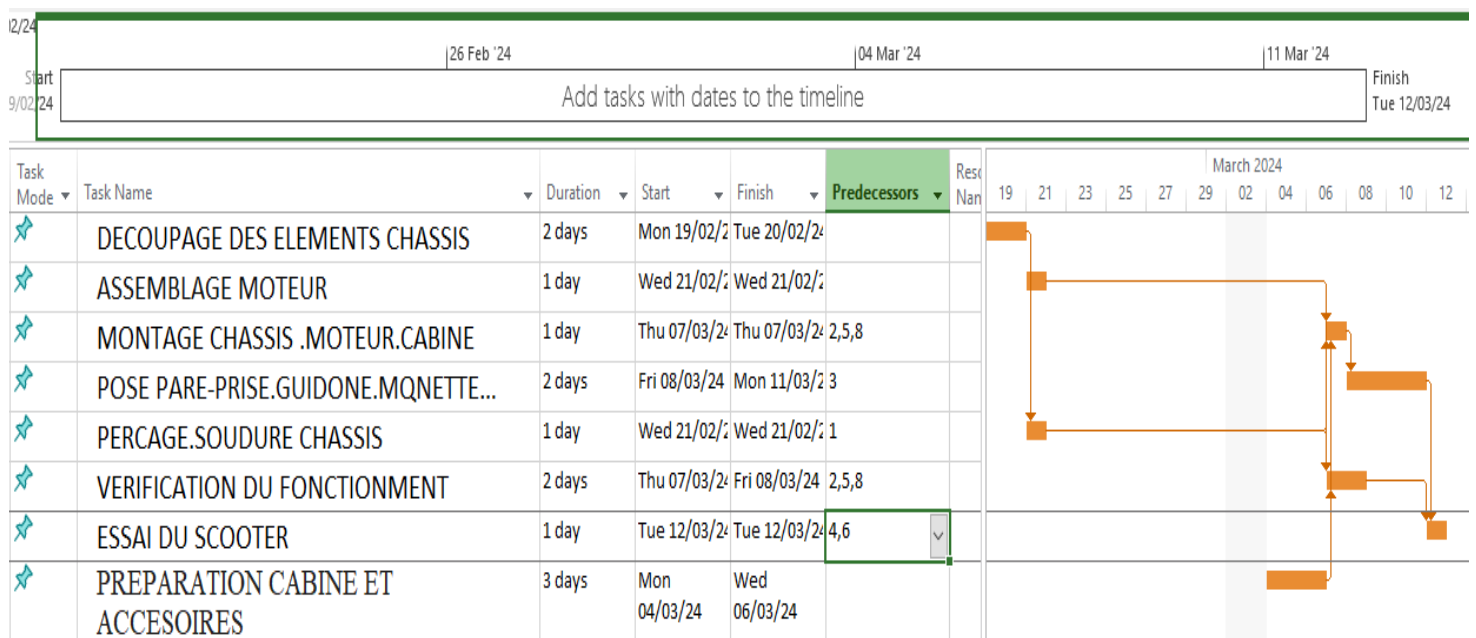

4. Quelles sont les parties prenantes d'un projet ?

Réponses : Les parties prenantes d'un projet sont les individus ou groupes qui ont un intérêt dans le projet ou qui seront affectés par ses résultats, tels que les clients, les membres de l'équipe, les fournisseurs et les actionnaires.

5. Donner une définition du : WBS, PBS, et OBS.

Réponses : WBS (Work Breakdown Structure) est une décomposition hiérarchique des tâches du projet. PBS (Product Breakdown Structure) est une décomposition des produits ou livrables du projet. OBS (Organizational Breakdown Structure) est une représentation de la structure organisationnelle impliquée dans le projet.

Citer les différentes méthodes de planification d'un projet ?

Réponses : Il existe plusieurs méthodes de planification de projet, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques-unes des méthodes les plus couramment utilisées : Méthode du chemin critique

Méthode de la chaîne critique

Diagramme de Gantt

Méthode PERT

Méthode Agile

Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients, et le choix de la méthode appropriée dépend souvent des besoins spécifiques du projet, de la culture de l'organisation et des préférences de l'équipe de gestion de projet.

6. Quelle est la différence entre la marge libre et la marge totale ?

Réponses : La marge libre est la quantité de temps qu'une tâche peut être retardée sans affecter le chemin critique, tandis que la marge totale est la quantité de temps qu'une tâche peut être retardée sans affecter la date de fin du projet.

7. Qu'est-ce que le contrôle et suivi de projet ?

Réponses : Le contrôle et le suivi de projet consistent à surveiller l'avancement du projet par rapport au plan établi, à prendre des mesures correctives si nécessaire et à s'assurer que les objectifs sont atteints dans les délais et le budget impartis.

8. Citer les indicateurs de performances (KPI) dans la gestion de projet ?

Réponses : Les indicateurs de performances (KPI) dans la gestion de projet peuvent inclure le taux de réalisation des tâches, le respect des délais, le respect du budget, la satisfaction du client, etc.

9. Comment créer un tableau de bord projet

Réponses : Pour créer un tableau de bord de projet, identifiez les KPI pertinents, collectez les données nécessaires, utilisez un logiciel de visualisation de données pour créer des graphiques et des tableaux, et mettez à jour régulièrement les informations pour suivre les progrès du projet.

10. Quels sont les éléments d'un tableau de bord projet ?

Réponses : Les éléments d'un tableau de bord de projet comprennent généralement des graphiques de performances, des indicateurs clés, des calendriers, des rapports d'avancement, des alertes pour les écarts par rapport aux objectifs, et des informations sur les ressources et les coûts.
